

Prezados Aeroquadrienses,

Já iniciamos a segunda etapa de obras referente aos novos investimentos aprovados na última assembleia do dia 18/06/16.

Devido à adesão de alguns associados ao plano de antecipação de parcelas e quitação, conseguimos uma boa arrecadação inicial de forma a possibilitar um ótimo avanço das obras, sendo elas:

Conclusão do quiosque: Foram retomadas as obras do quiosque com planejamento para conclusão total até o mês de Novembro/16.











Cobertura do tanque de AVGAS: Contratamos a execução da estrutura metálica da cobertura do tanque, colocação das telhas, fechamentos laterais do telhado, calhas, instalações elétricas e pintura. Neste momento ainda não serão instalados gradil e portões. Na sequência, estaremos operacionalizando o tanque de abastecimento que está na dependência apenas da ligação da energia elétrica das quadras.

COBERTURA DO TANQUE

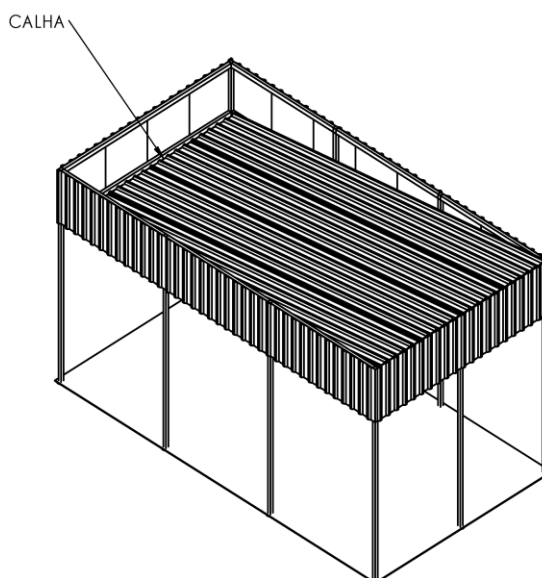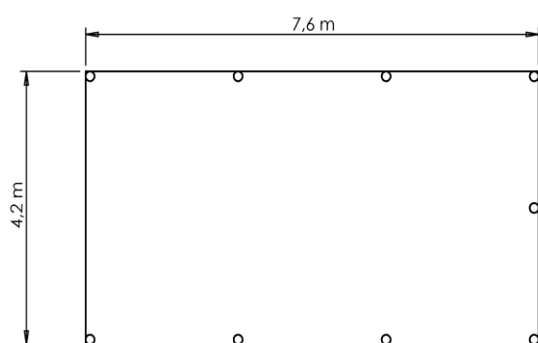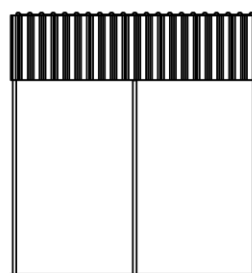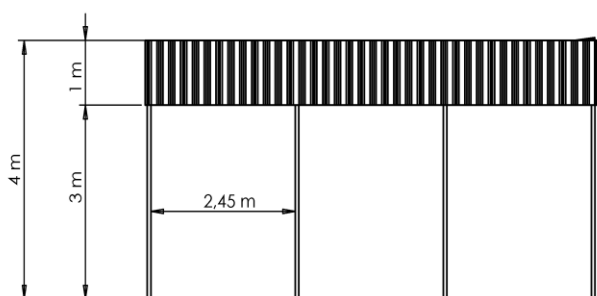

Pavimentação das ruas: Iniciamos a pavimentação das ruas com bloquetes intertravados. Este primeiro avanço consiste na pavimentação de 2.000 m² que representa aproximadamente 8% do total a ser pavimentado.










INFORMATIVO AEROQUADRA – SETEMBRO/2016

Estamos trabalhando também em algumas melhorias no sistema de escoamento de águas pluviais do Aeroquadra.

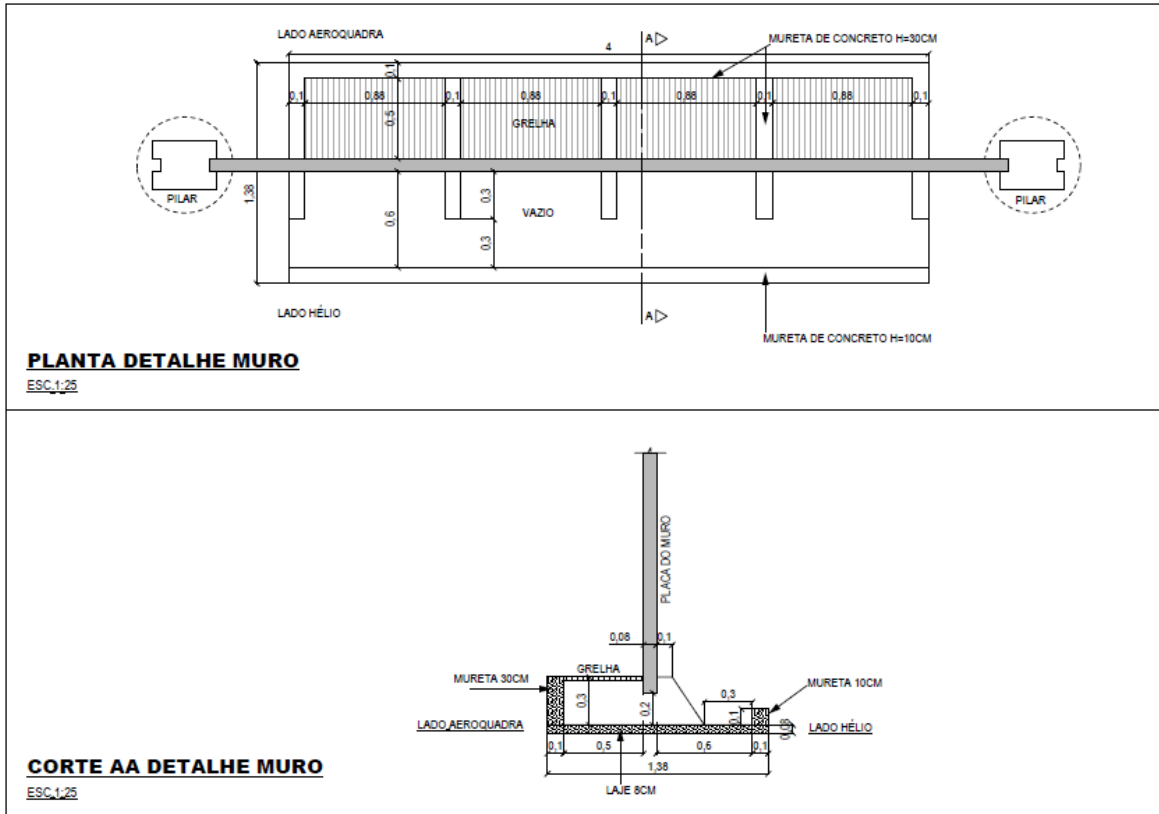

INFORMATIVO AEROQUADRA – SETEMBRO/2016

Obras particulares: Além das obras de responsabilidade da associação, já temos três obras de hangares/casas particulares sendo finalizadas e três projetos aprovados para inicialização.







Trator e roçadeira: Com a chegada da primavera, a manutenção do gramado será mais frequente. Com isso, estaremos adquirindo o trator e a roçadeira no próximo mês (Outubro/16).

Antecipação de parcelas ou quitação: Lembramos que o plano de descontos para antecipação de parcelas ou até a quitação continua e a qualquer momento os associados poderão solicitar a tesouraria o envio da planilha de cálculo de descontos. A todos os associados que puderem aderir a este plano, lembramos que além de estar recebendo um desconto equivalente à maioria das aplicações financeiras, estarão colaborando com o adiantamento da conclusão das obras inicialmente previsto para Junho/18 e conseqüentemente adiantando a valorização do Aeroquadra.

Fornecimento de energia elétrica para as unidades privativas: Em conversas extraoficiais com algumas pessoas da concessionária Elektro, ficamos sabendo de um possível planejamento para execução da obra do Aeroquadra até o final deste mês de Setembro. Porém, pelo fato de ser uma informação extraoficial e sabendo dos atrasos frequentes da concessionária, não devemos considerar esta previsão como certa. De qualquer forma, continuaremos pressionando a concessionária para que esta obra seja executada o mais rápido possível.

Trânsito de veículos nos gramados do Aeroquadra: Estamos trabalhando na conscientização dos prestadores de serviço no sentido de não transitar com veículos pelos gramados, visto que já houve bastantes estragos e conseqüentes correções feitas pelo nosso caseiro. Porém são vistos frequentemente alguns associados dando mau exemplo, por isso, pedimos a colaboração de todos neste sentido.



INFORMATIVO AEROQUADRA – SETEMBRO/2016

Festa de inauguração do quiosque: Estaremos planejando uma festa de inauguração do quiosque para o mês de Novembro. Todos os detalhes desta festa serão passados no próximo informativo.

Agradecimentos:

Mais uma vez agradecemos a todos os envolvidos, pela dedicação a favor do Clube de Voo Aeroquadra e a todos os associados, pelas confianças depositadas.

Atenciosamente,

A Diretoria.
